

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

11月18日(日)～12月1日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候等により多少前後致します。

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目(芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近)上下線

【工事時間】 夜間 21:00～翌朝6:00(土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。)

【工事内容】 11月18日(日)～12月1日(土)の間の作業

切削・基層工/表層工 : 既設舗装版を約5cm削り、基層舗装を5cm厚さでアスファルトを敷きならしめます。基層舗装完了後、表層舗装(排水性舗装(低騒音型))を5cmの厚さで敷き均します。段差が発生する場所はすり付け舗装を行います。

半たわみ舗装 : バス停部分の強化のためにセメントミルクを注入する工事を行います。

人孔調整 : 車道舗装工事を行うために舗装内に埋め込んだマンホールを舗装表面合わせ調整します。

表面強化工 : 舗装完了後、Uターンレーンや交差点内の舗装の表面に樹脂を散布し、舗装表面の強化を行います。

工事予定時間

比較的騒音が発生する工事


| 工程 | 時間 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | |
|---------|--------------|-------|-------------------------------|-----------|------|------|-------|----------------|------|---------------------|--------|------|
| 夜間作業 | ① 切削・基層工/表層工 | 規制設置 | 路面切削 | | | | 乳剤散布 | アスファルト敷均し(基層工) | 乳剤散布 | アスファルト敷均し(表層工)・仮区画線 | すり付け舗装 | 規制撤去 |
| | ② 半たわみ舗装 | 規制設置 | 養生設置 | セメントミルク注入 | 硬化養生 | 規制切替 | 養生設置 | セメントミルク注入 | 硬化養生 | | | 規制撤去 |
| | ③ 人孔調整(舗装切断) | 規制設置 | 舗装切断(約1時間/一箇所) 順次規制を移動し施行します。 | | | | | | | | | 規制撤去 |
| | ④ 人孔調整(人孔調整) | 規制設置 | 舗装版撤去 | | | | | | 人孔調整 | | | 規制撤去 |
| ④ 表面強化工 | 規制設置 | 表面強化工 | | | | 規制切替 | 表面強化工 | | | | 規制撤去 | |

切削・基層工/表層工においては路面切削時(21:30～1:00頃)にアスファルトを削る音が出ますが、激しくたたくような音等が発生しないように注意して施工を行います。

人孔調整においては舗装版撤去時(21:30～1:00頃)にアスファルトを撤去する音が出ますが、防音シートにて養生を行い大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。

車両の通行を確保するために中央分離帯側の車線と歩道側の車線に分け2回施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がございましたら右の連絡先 昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)
 夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)
 でお問い合わせください。
 (夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)

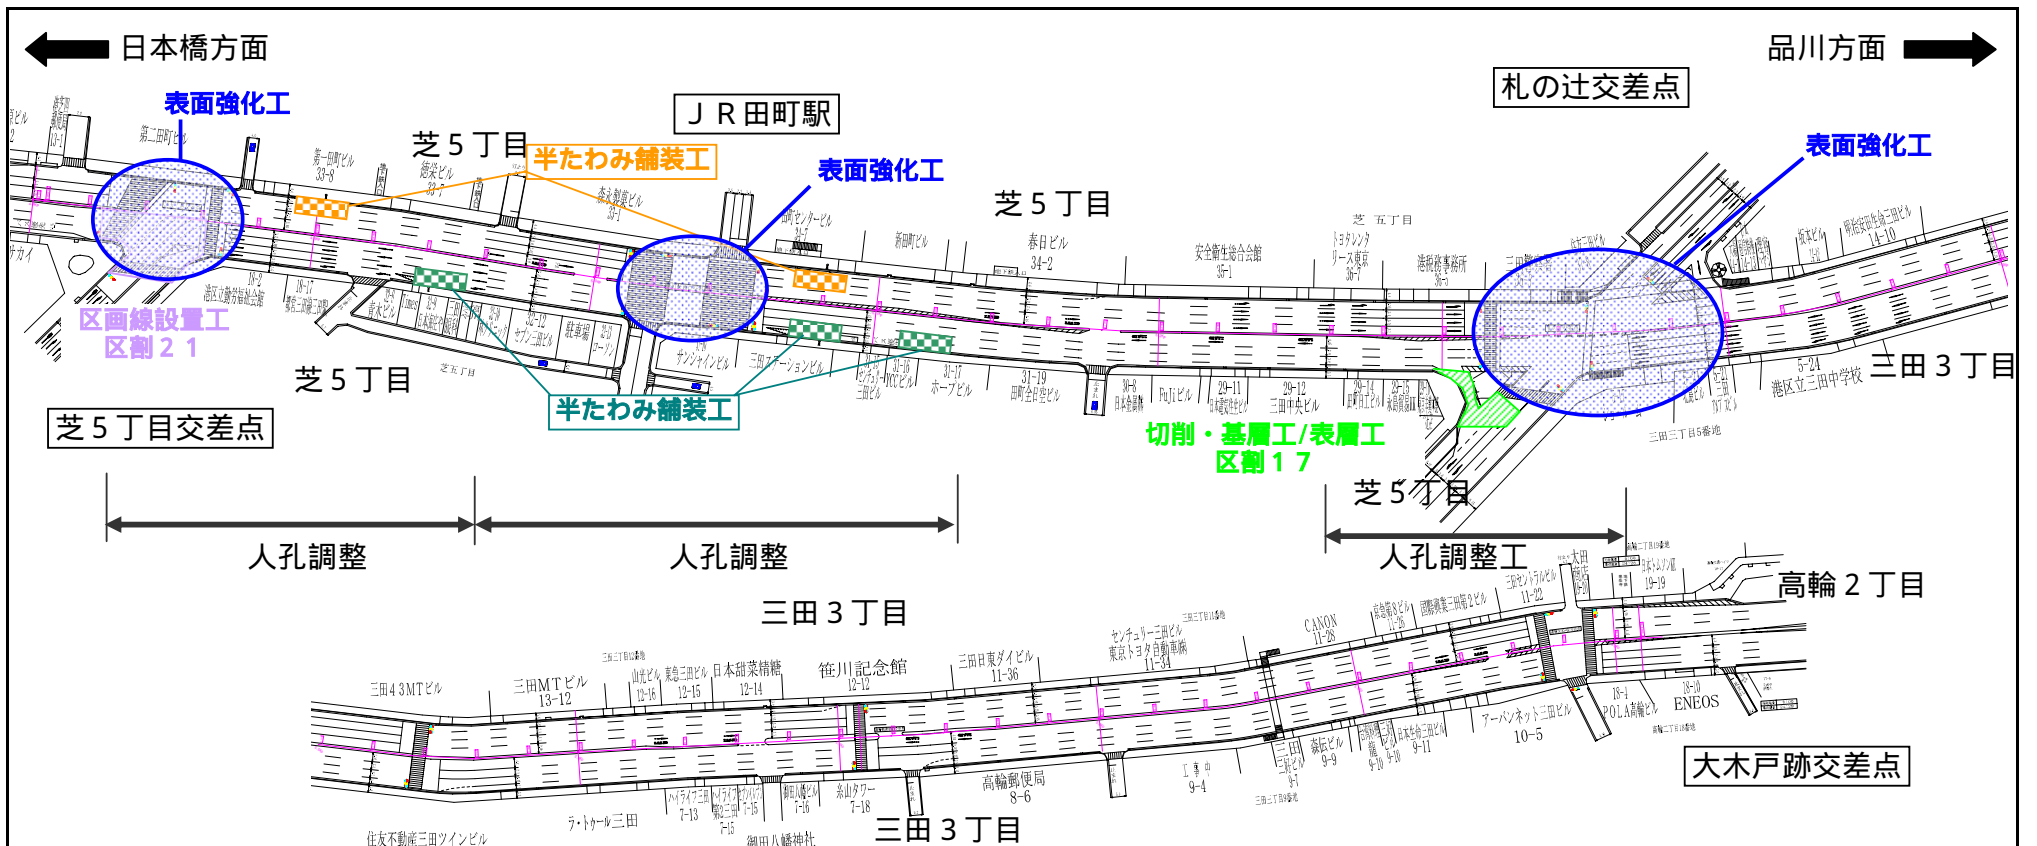

| 工種 | 施工箇所 | 作業予定内容 | 来週の予定 | | | | | | | 再来週の予定 | | | | | | | 備考 |
|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|
| | | | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 1(土) | |
| 車道舗装工 | 上り線 | 切削・基層工/表層工 | 休 | 17 | | | | | | | | | | | | | 現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。 |
| バス停工 | 上下線 | 半たわみ舗装工(夜間施工) | 日 | | 下り線 | 上り線 | | | | | | | | | | | |
| 人孔調整工 | 上下線 | 人孔高さ調整(夜間施工) | マ | 東 | | | | 舗装切断 | 舗装切断 | 日 | 人孔調整 | 人孔調整 | 人孔調整 | 人孔調整 | 人孔調整 | 人孔調整 | |
| 表面強化工 | 上下線 | 表面強化工(夜間施工) | ラ | 京 | | | | | | | | | | | | | |
