



月間工程表(9月)

1

工事件名：梅島舗装修繕工事

工期 <当初> 平成18年10月03日から平成20年01月31日まで
 <変更(案)> 平成18年10月03日から平成20年09月30日まで

請負者 大林道路株式会社 関東支店
 現場代理人 多田 賢

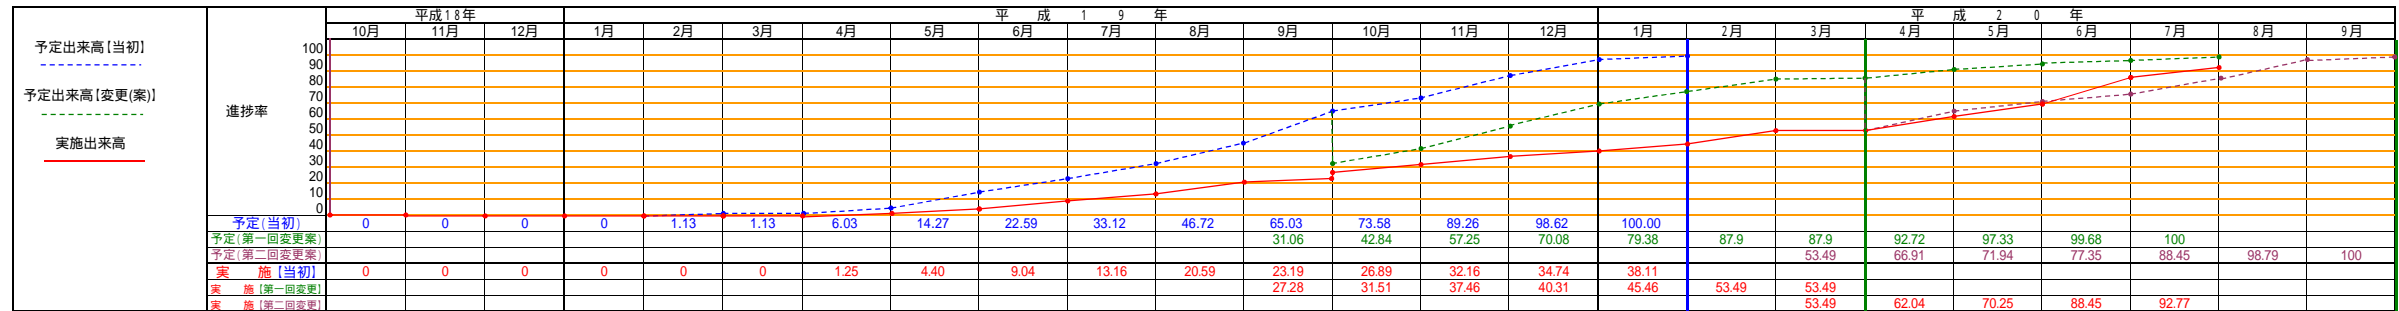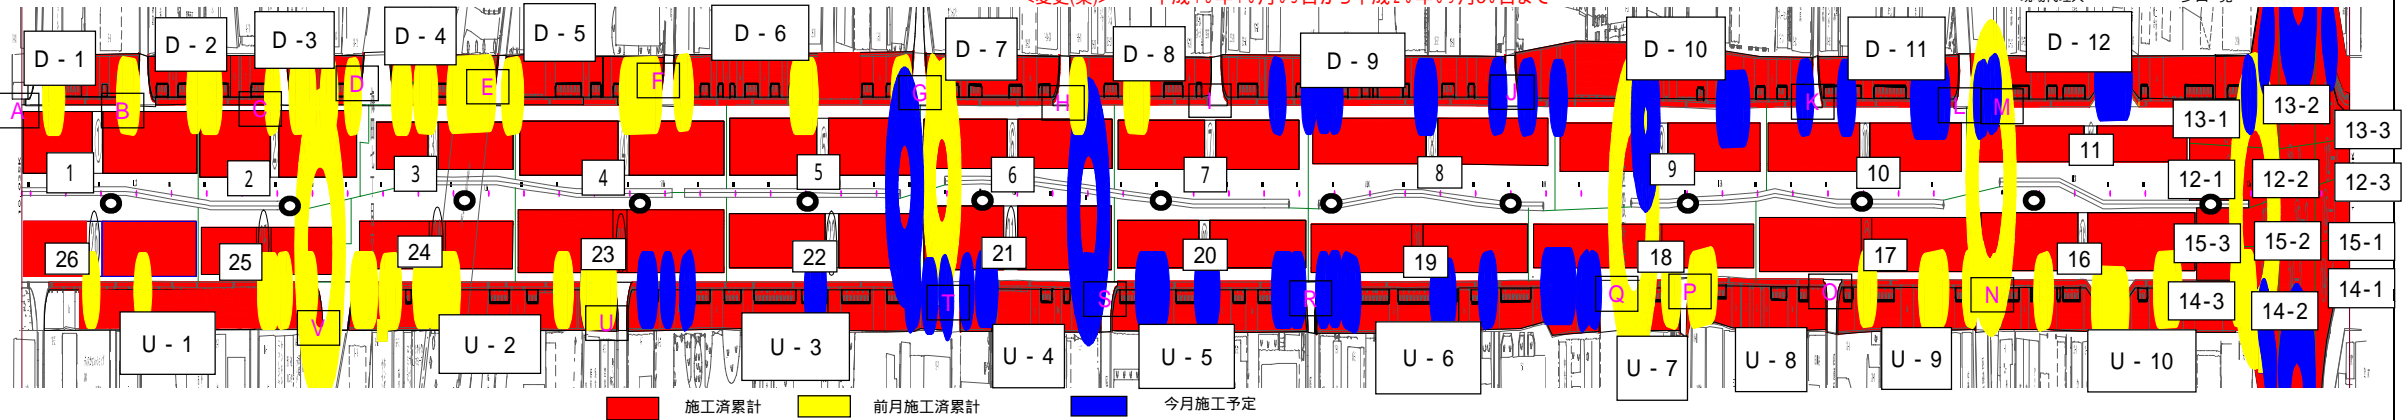

費目・工種	種別	細別	規格	単位	全体数量	施工済数量	今月予定数量	進捗率	平成18年																														備考	
									10月					11月					12月					平成19年					平成20年											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		7
道路修繕 舗装修繕工	車道打換工	舗装版切断	t=20cm以下	m	55	55	0	0.00%	完																															
		切削オーバーレイ		m2	21,010	21,080	0	100.33%	完																															
	歩道打換工	表層工		m2	21,010	20,554	0	97.83%	完																															
		支道打換(1)	作業延長20m未満	m2	660	684	0	103.64%	完																															
										ダム廻り全般																														
	排水工	街渠修理	街渠修理(1)	一般部 フレキャスト	m	1,533	1,602	0	104.50%	完																														
			街渠修理(2)	切下り部 フレキャスト WB-1.2	m	522	422	0	80.84%	完																														
		雑工	バス停止		m2	307	272	0	88.60%	完																														
			すり付け舗装		m2	1	1	0	100.00%	完																														
											目地補修																													
									清掃全般																															
									工期終了																															
