

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

1月27日(日)～ 2月 9日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候等により多少前後致します。

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目（芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近）上下線、大木戸跡交差点付近 上り線

【工事時間】 夜間 21:00～翌朝6:00（土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。）

【工事内容】 1月27日（日）～ 2月 9日（土）の間の作業

- ①歩道舗装修理 : 歩道の古い舗装を撤去し、アスファルト舗装にて基層を施工しコンクリート平板ブロックを敷設します。
- ②歩道舗装修理 (CAB蓋部) : 電線を収納した共同溝の蓋部分を平板ブロックへ交換します。
- ③切削・オーバーレイ : 既設舗装版を約5cm削り表層舗装を5cmの厚さでアスファルトを敷きならしめます。


工事予定時間

比較的騒音が発生する工事

工程	時間	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
夜間作業	① 歩道舗装修理 (打換)	規制設置	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	路床調整	路盤不陸調整	基層工	擦付け舗装	片付け	規制撤去
	② 歩道舗装修理 (平板設置)	規制設置	擦付け舗装撤去	擦付け舗装撤去	擦付け舗装撤去	擦付け舗装撤去	擦付け舗装撤去	平板ブロック敷設	平板ブロック敷設	片付け	規制撤去
	③ 歩道舗装修理 (CAB蓋部)	規制設置	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	既設舗装撤去	片付け	規制撤去
	④ 切削・基層工	規制設置	路面切削	路面切削	路面切削	路面切削	路面切削	路面切削	路面切削	規制撤去	規制撤去

- ①-1 歩道舗装修理 (打換) においては既設舗装版撤去時 (21:30～24:00頃) にアスファルトを撤去する音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。
- ①-2 歩道舗装修理 (平板) においては擦付け舗装撤去時 (21:30～22:30頃) にアスファルトを撤去する音、ダンプトラックに積み込む音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。また、平板の切断加工については作業開始当初に施工を行います。
- ② 歩道舗装修理 (CAB蓋部) においては蓋内の既設舗装版撤去時 (21:30～24:00頃) に撤去する音が出ますが、24時以降大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。また、平板ブロック切断加工については作業開始当初に施工を行います。
- ③ 切削オーバーレイにおいては路面切削時 (21:30～24:00頃) にアスファルトを削る音が出ますが、激しくたたくような音等が発生しないように注意して施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がありましたら右の連絡先までお願いします。
 昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)
 夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)
 (夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)

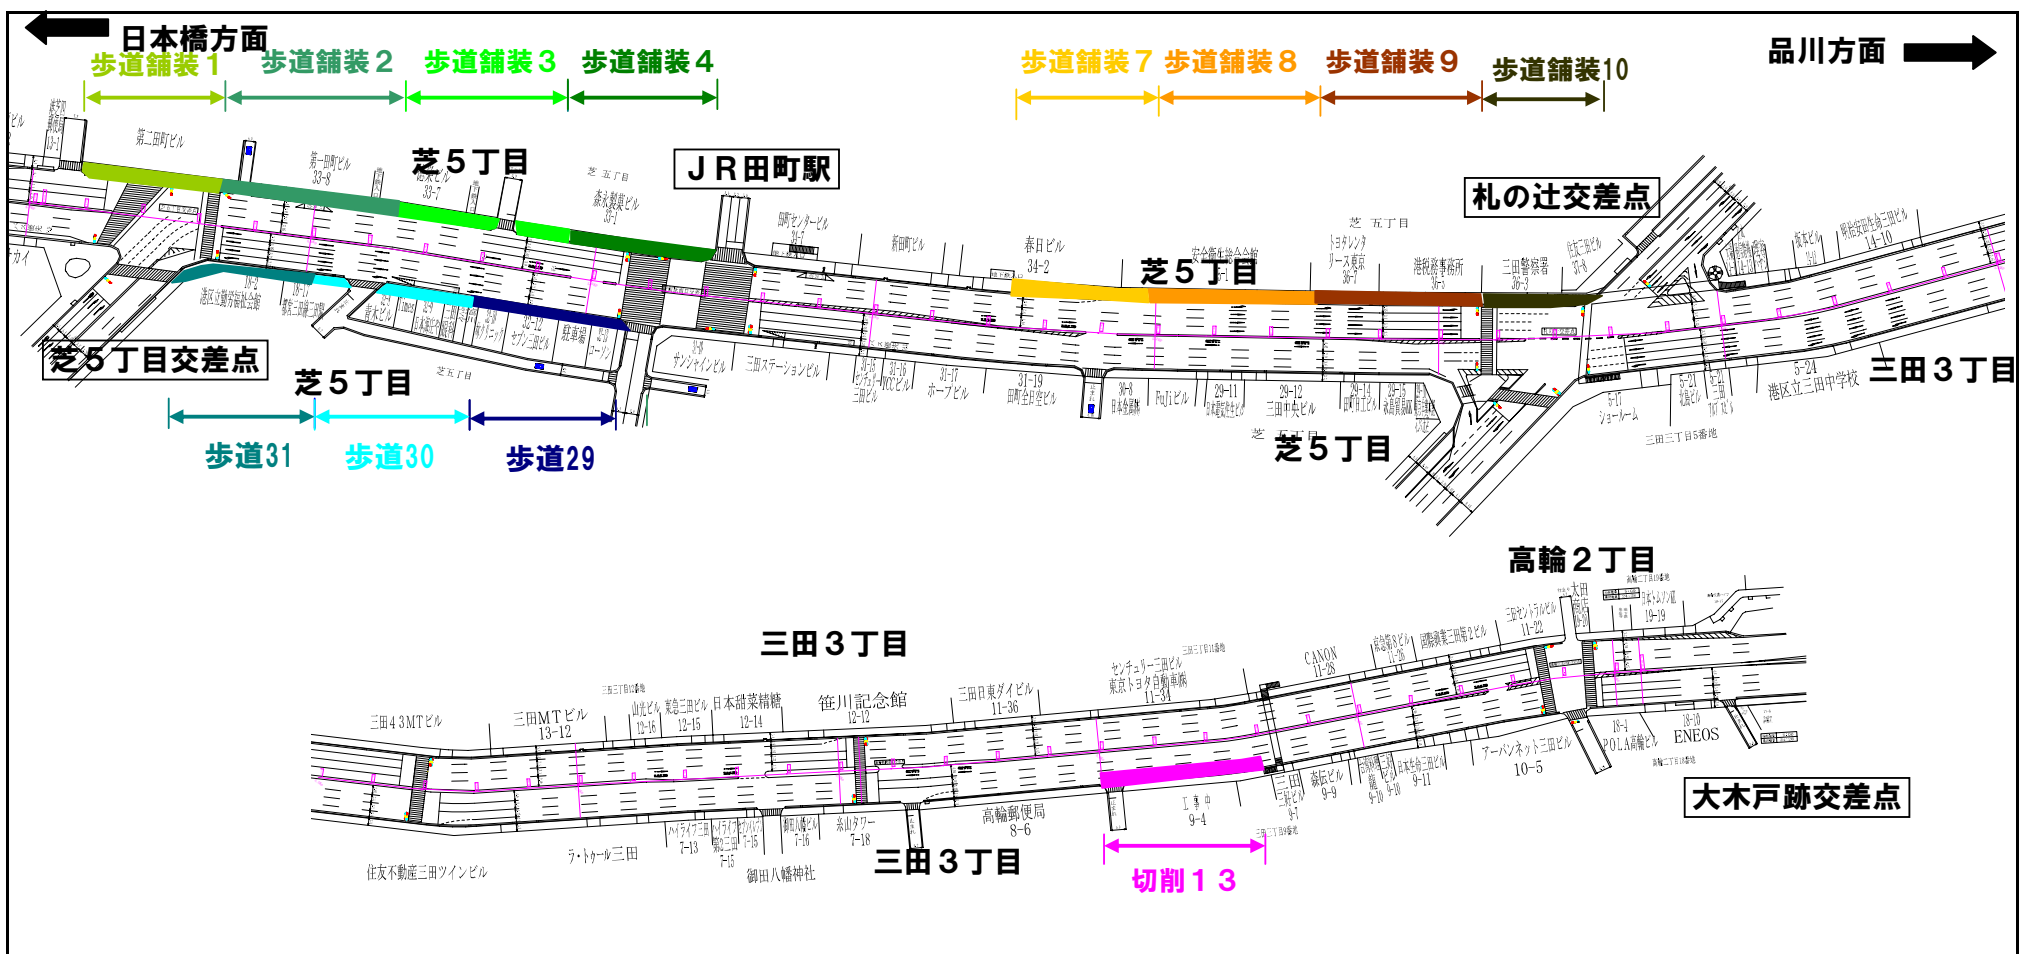

工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定					備考
			27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	1(金)	2(土)	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	
歩道舗装工	下り線 歩道 1・2・3・4	歩道舗装修理	歩道4	歩道3	歩道3	歩道3	歩道3	歩道2	歩道2	歩道2	歩道2	歩道1	歩道1	歩道1	※現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。
	下り線 歩道 9・8・7・4・3・2		歩道8	歩道8	歩道9	歩道8	歩道7	歩道4	歩道4	歩道3	歩道3	歩道2	歩道2	歩道2	
	上り線 歩道31		歩道31	歩道31	歩道31	歩道31	歩道31	歩道31							
	下り線 歩道10		歩道10	歩道10	歩道10	歩道10	歩道10	歩道10							
車道舗装工	上り線 切削13	切削オーバーレイ													切削13
