月　間　工　程　表　（12月）

工事件名　：　梅 島 舗 装 修 繕 工 事

工　期　<当初>　平成18年10月03日から平成20年01月31日まで
<変更(案)>　平成18年10月03日から平成20年07月31日まで

請 負 者　大林道路株式会社　関東支店
現場代理人　多田　覚

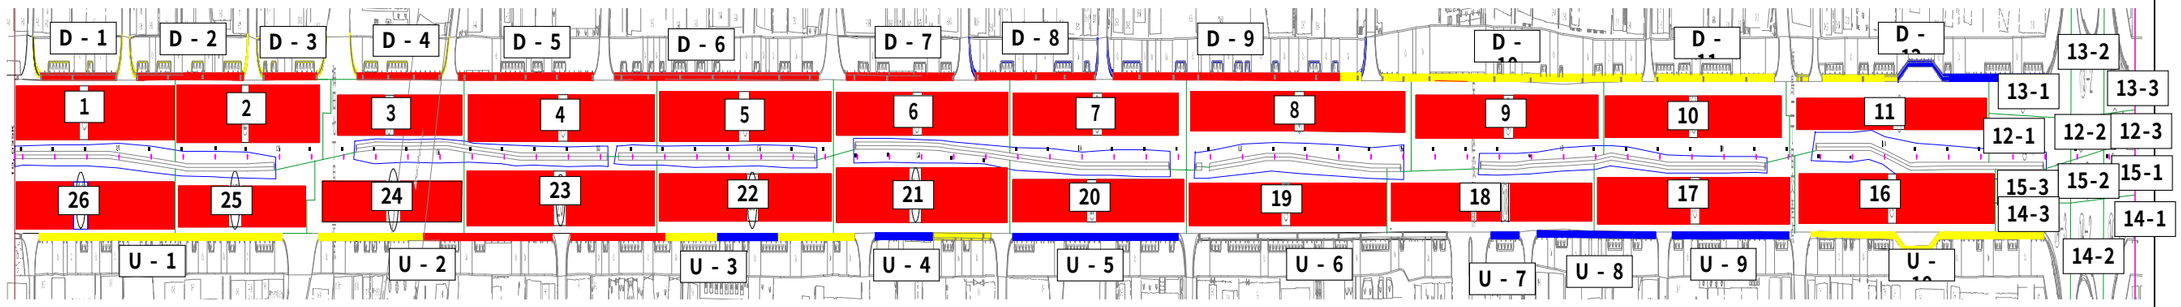

施工済累計　前月施工済累計　今月施工予定

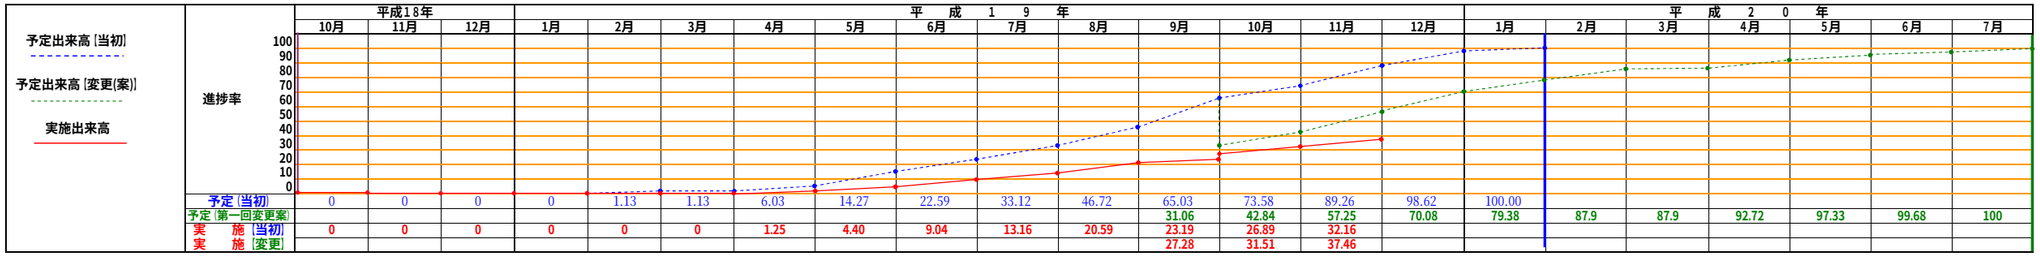

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
予定（当初）	0	0	0	0	1.13	1.13	6.03	14.27	22.59	33.12	46.72	65.03	73.58	89.26	98.62	100.00						
予定（第一回変更案）												31.06	42.84	57.25	70.08	79.38	87.9	87.9	92.72	97.33	99.68	100
実　施［当初］	0	0	0	0	0	0	1.25	4.40	9.04	13.16	20.59	23.19	26.89	32.16								
実　施［変更］												27.28	31.51	37.46								
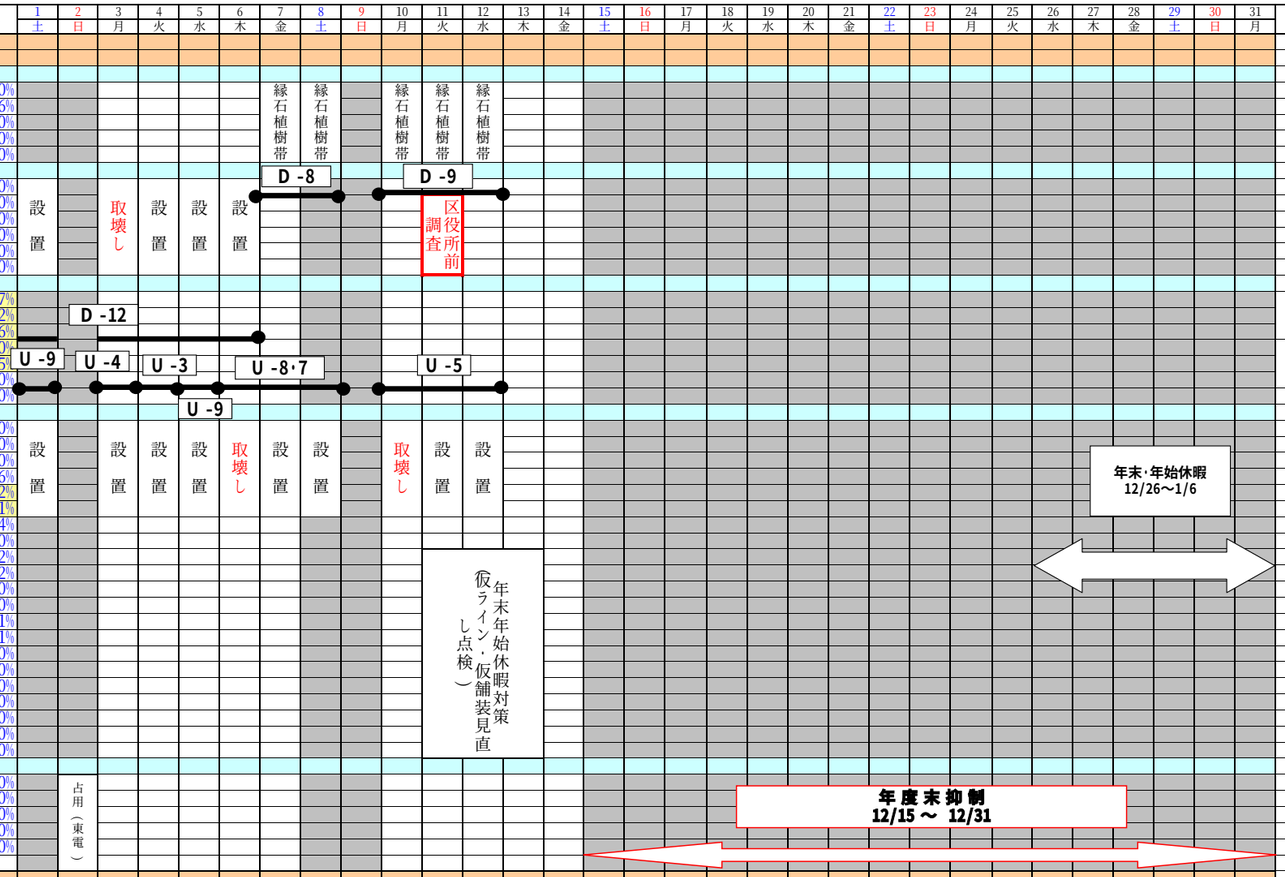
費目・工種	種 別	細 別	規 格	単位	全体数量	施工済数量	今月予定数量	進捗率
道路修繕				式	1			
舗装修繕工				式	1			
	車道打換工			式	1			
		舗装版切断	t=20cm以下	m	55	0.00	0	0.00%
		切削オーバーレイ		m2	21,010	18,817.00	0	89.56%
		表層工		m2	21,010	0.00	0	0.00%
		支道打換(1)	作業延長20m未満	m2	660	0.00	0	0.00%
		支道打換(2)	作業延長20m以上	m2	240	0.00	0	0.00%
	歩道打換工			式	1			
		歩道打換(1)	一般部　透水型	m2	5,530	0.00	0	0.00%
		歩道打換(2)	点字部　透水型	m2	730	0.00	0	0.00%
		歩道打換(3)	蓋上部	m2	45	0.00	0	0.00%
		切下げ修理(1)	WB-1	m2	327	0.00	0	0.00%
		切下げ修理(2)	WB-2	m2	1,560	0.00	0	0.00%
		切下げ修理(3)	WB-3	m2	234	0.00	0	0.00%
	排水工			式	1			
		街渠桝修理		箇所	110	85.00	19	77.27%
		街渠修理(1)	一般部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	1,533	1,144.00	331	74.62%
		街渠修理(2)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-1,2	m	522	325.00	78	62.26%
		街渠修理(3)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-3	m	49	27.00	4	55.10%
		街渠修理(4)	横断歩道部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	38	49.00	4	128.95%
		街渠修理(5)	交差点部　現場打ち	m	49	0.00	0	0.00%
		街渠修理(6)	交差点部　現場打ち	m	79	0.00	0	0.00%
	雑工			式	1			
		バス停工		m2	307	0.00	0	0.00%
		すり付け舗装		式	1	0.00	0	0.00%
		舗装止めﾌﾞﾛｯｸ修理		m	2,440	0.00	0	0.00%
		中央分離帯修理		m	1,028	1,079.00	0	104.96%
		縁石修理		m	328	46.00	21	14.02%
		植樹帯修理		m	1,184	109.00	96	9.21%
		横断防止柵撤去		m	1,315	800.00	0	60.84%
		横断防止柵設置		m	1,315	0.00	0	0.00%
		横断抑止柵撤去		m	236	237.00	0	100.42%
		横断抑止柵設置		m	236	237.00	0	100.42%
		ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	124	0.00	0	0.00%
		ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置		m	124	0.00	0	0.00%
		遮音壁撤去・再設置(1)	2層	m	185	200.00	0	108.11%
		遮音壁撤去・再設置(2)	1層	m	606	600.00	0	99.01%
		距離標設置(1)	百米標	箇所	24	0.00	0	0.00%
		距離標設置(2)	千米標	箇所	2	0.00	0	0.00%
		管理銘板設置		箇所	14	0.00	0	0.00%
		施錠工		箇所	28	0.00	0	0.00%
		発生品運搬		式	1	0.00	0	0.00%
		残土二次運搬		式	1	0.00	0	0.00%
		植栽撤去		式	1	1.00	0.00	100.00%
	区画線設置工			式	1			
		実線・ｾﾞﾌﾞﾗ	W=15cm	m	3,660	0.00	0	0.00%
		実線・ｾﾞﾌﾞﾗ	W=30cm	m	190	0.00	0	0.00%
		ｾﾞﾌﾞﾗ	W=15cm	式	1,860	0.00	0	0.00%
		破線	W=15cm	m	1,270	0.00	0	0.00%
		矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	1,260	0.00	0	0.00%
直接工事費				式	1			
企業工事
