月　間　工　程　表（６月）

工事件名　：　梅 島 舗 装 修 繕 工 事

工　期　　平成18年10月03日から平成20年01月31日まで

請 負 者　大林道路株式会社 関東支店
現場代理人　多田 覚

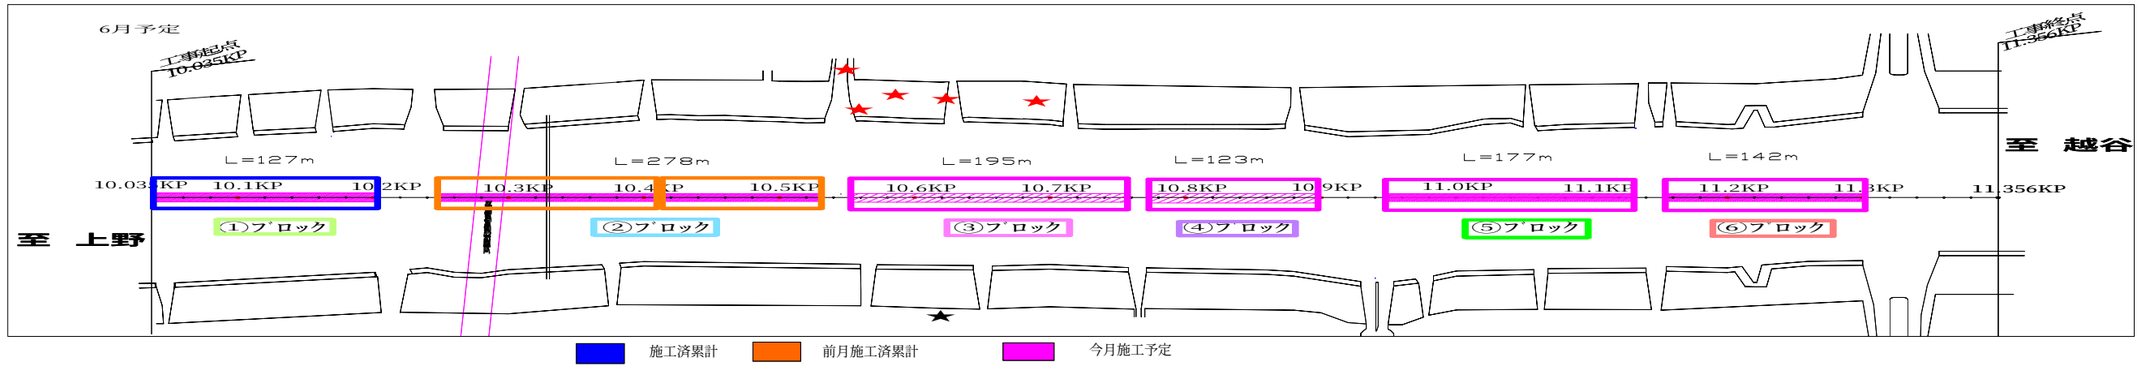



費目･工種	種 別	細 別	規 格	単位	全体数量	施工済数量	今月予定数量	進捗率
道路修繕				式	1			0.00%
舗装修繕工				式	1			0.00%
	車道打換工			式	1			0.00%
		舗装版切断	t=20cm以下	m	55	0.00	0.00	0.00%
		切削オーバーレイ		m2	21,010	0.00	0.00	0.00%
		表層工		m2	21,010	0.00	0.00	0.00%
		支道打換(1)	作業延長20m未満	m2	660	0.00	0.00	0.00%
		支道打換(2)	作業延長20m以上	m2	240	0.00	0.00	0.00%
	歩道打換工			式	1			0.00%
		歩道打換(1)	一般部　透水型	m2	5,530	0.00	0.00	0.00%
		歩道打換(2)	点字部　透水型	m2	730	0.00	0.00	0.00%
		歩道打換(3)	蓋上部	m2	45	0.00	0.00	0.00%
		切下げ修理(1)	WB-1	m2	327	0.00	0.00	0.00%
		切下げ修理(2)	WB-2	m2	1,560	0.00	0.00	0.00%
		切下げ修理(3)	WB-3	m2	234	0.00	0.00	0.00%
	排水工			式	1			0.00%
		街渠桝修理		箇所	110	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(1)	一般部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	1,533	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(2)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-1,2	m	522	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(3)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-3	m	49	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(4)	横断歩道部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	38	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(5)	交差点部　現場打ち	m	49	0.00	0.00	0.00%
		街渠修理(6)	交差点部　現場打ち	m	79	0.00	0.00	0.00%
	雑工			式	1			0.00%
		バス停工		m2	307	0.00	0.00	0.00%
		すり付け舗装		式	1	0.00	0.00	0.00%
		舗装止めﾌﾞﾛｯｸ修理		m	2,440	0.00	0.00	0.00%
		中央分離帯修理		m	1,028	522.00	506.00	50.78%
		縁石修理		m	328	0.00	0.00	0.00%
		植樹帯修理		m	1,183	0.00	0.00	0.00%
		横断防止柵撤去		m	1,315	0.00	0.00	0.00%
		横断防止柵設置		m	1,315	0.00	0.00	0.00%
		横断抑止柵撤去		m	236	165.10	70.90	69.96%
		横断抑止柵設置		m	236	0.00	0.00	0.00%
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	124	0.00	0.00	0.00%
		ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置		m	124	0.00	0.00	0.00%
		遮音壁撤去･再設置(1)	2層	m	185	90.00	50.00	48.65%
		遮音壁撤去･再設置(2)	1層	m	606	158.50	150.00	26.16%
		距離標設置(1)	百米標	箇所	24	0.00	0.00	0.00%
		距離標設置(2)	千米標	箇所	2	0.00	0.00	0.00%
		管理銘板設置		箇所	14	0.00	0.00	0.00%
		施錠工		箇所	28	0.00	0.00	0.00%
		発生品運搬		式	1	0.00	0.00	0.00%
		残土二次運搬		式	1	0.00	0.00	0.00%
	区画線設置工			式	1			0.00%
		実線･ｾﾌﾞﾗ	W=15cm	m	3,660	0.00	0.00	0.00%
		実線･ｾﾌﾞﾗ	W=30cm	m	190	0.00	0.00	0.00%
		ｾﾌﾞﾗ	W=15cm	式	1,860	0.00	0.00	0.00%
		破線	W=15cm	m	1,270	0.00	0.00	0.00%
		矢印･記号･文字	W=15cm換算	m	1,260	0.00	0.00	0.00%
直接工事費				式	1			0.00%
	東京都下水道局		調査･設計業務	箇所	314			
企業工事								

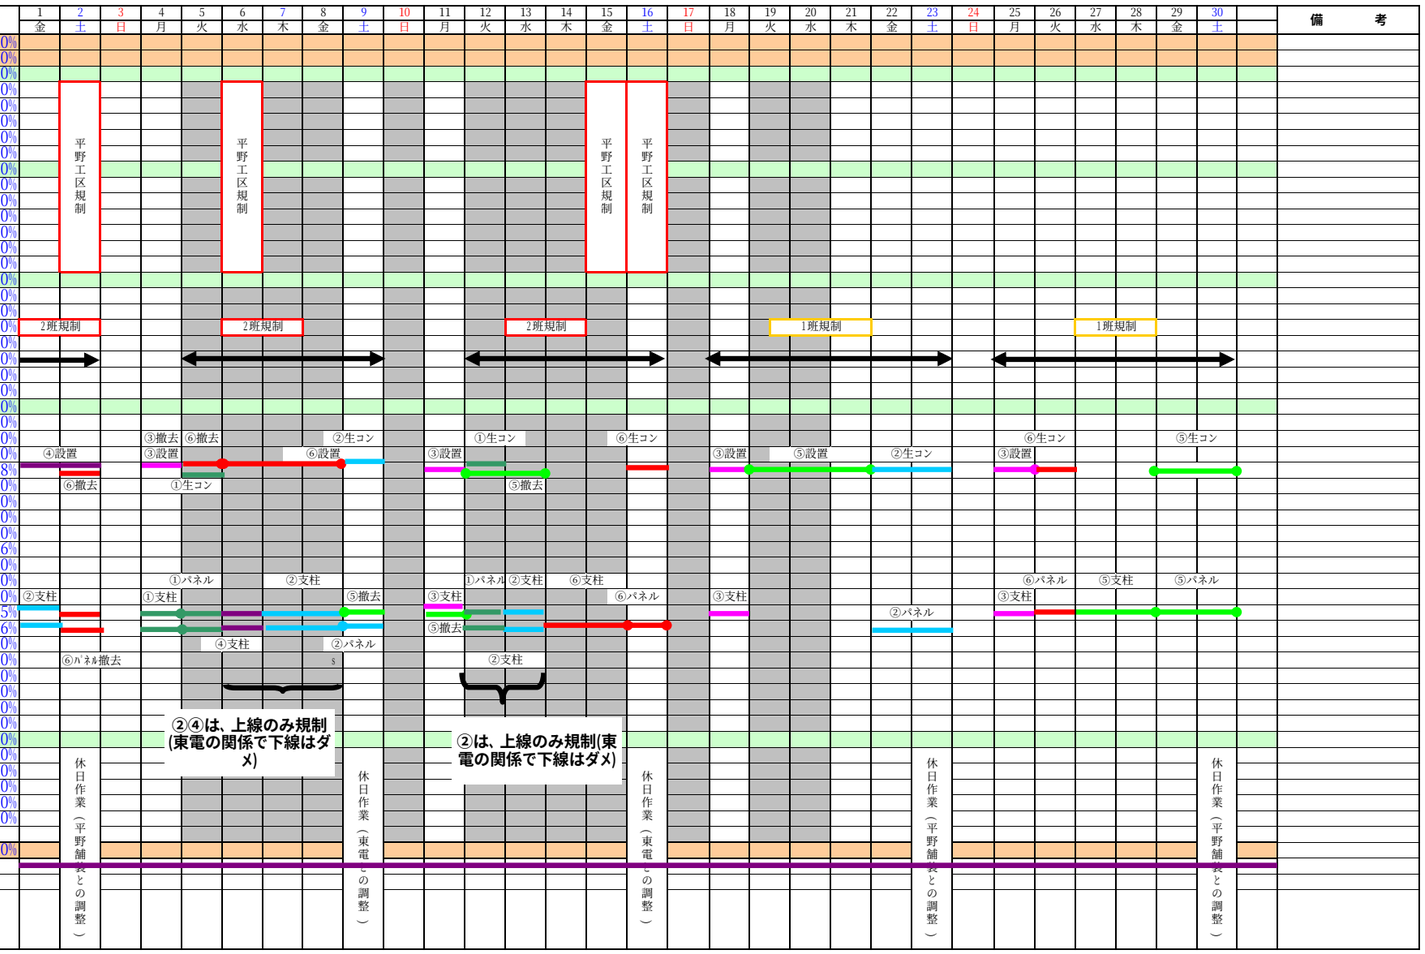

備　考
